

十八女町の皆さんへ

令和2年9月2日

湯浅恵次

090 - 7575 - 1994

### 大西堰撤去工事再開について

○10月より大西堰の撤去工事が再開されます。右岸（水井側）に残っている部分を撤去します。そのため仮設栈橋を作ります。この工事により騒音でご迷惑をおかけします。

○環境配慮ブロックと根固めブロックを設置します。

○頻繁にトラックが通行します。ほとんどは深瀬、七浦を經由して加茂谷橋を渡り下へ向かいますが、特殊な大型車両については加茂を經由します。

○工事の概要と工程表をご覧ください。

## ⑨国営 那賀川 農地防災

○工事車両には上のようなプレートを設置しています。お気づきの点があれば、プレートの色、番号等を確認しご連絡ください。

(0884 - 23 - 3833 農地防災事業所工事第二課)

# 工事概要


## 那賀川（二期）農地防災事業 吉井大西堰撤去工事

受注者：(株)大本組

**工事名：**那賀川（二期）農地防災事業 吉井大西堰撤去工事  
**工事場所：**徳島県阿南市十八女町大屋地先及び加茂町大西地先  
**工期：**令和元年9月27日～令和3年6月27日（640日間）  
**工事内容：**この工事は、国営那賀川土地改良事業計画に基づき、吉井大西堰を撤去するものである。  
 ア) 河川名：一級河川那賀川水系那賀川、流域面積：720km<sup>2</sup>  
 イ) 本体撤去工形式：固定堰 堰長：L=315m、堰体：L=273m、導水路：L=42m  
**連絡先：**現場代理人 森川 真治(徳島 賢典) TEL：0884-49-4830

Ⅱ期工事(2020年10月～2021年5月)


位置図

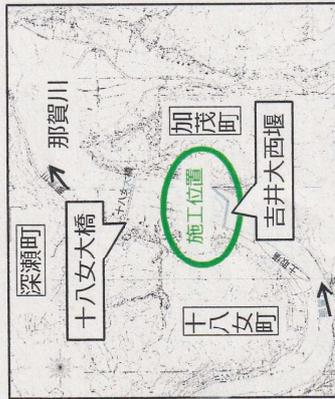


現地状況写真




仮設平面図

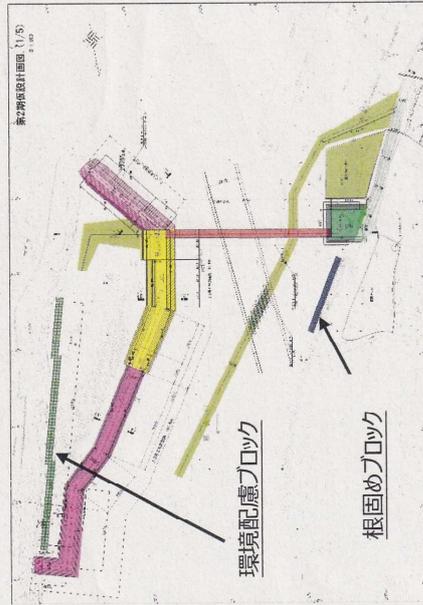


仮設標準断面図




環境配慮ブロック断面図



根固めブロック断面図



既設構造物撤去断面図



# 工事工程表

工事名：那賀川（二期）農地防災事業 吉井大西堰撤去工事  
 発注者：農林水産省 中国四国農政局  
 受注者：株式会社 大本組

施工済

工種	令和元年			令和2年			令和3年			備考
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
機械搬出入										
堰撤去 (コンクリート搬出)										
土工										
工事用道路										
鋼矢板打設 (矢板運搬)										
仮設栈橋工 (資材運搬)										
護岸工 (資材運搬)										
交通誘導員										

1年目施工(左岸側) 河川内工事期間

2年目施工(右岸側) 河川内工事期間

5~8台/日 4往復程度  
大型車が運搬します

6~9台/日 4往復程度  
大型車が運搬します

1台/日程度大型車  
の搬入があります

3台/日程度大型車  
の搬入があります

■ 工事用車両等が通行する工程

大型車両による作業がある場合に配置します

現場～土取場

大型車両による作業がある場合に配置します

現場～土取場

現場～土取場
